

Control del Documento:

Proyecto

Desarrollo de una aplicación web para la Prestación de Servicios Virtuales Vinculados a la promoción del emprendimiento (licencias de funcionamiento, registro de negocios, etc.) y pago de licencias de página web para la municipalidad distrital de lurigancho-chosica.

Título

Plan de desarrollo de Software.

Generado por

Ing. Roger Rojas Hilario.

Aprobado por

Cesal y la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica.

Alcance de la distribución

Documento Interno – alcance para las áreas correspondientes

Tabla de Contenido:

I. GENERALIDADES DEL PROYECTO	3
1. Descripción Del Proyecto.....	3
1.1. Propósito	3
1.2. Alcance	3
1.3. Objetivos	3
2. Artículos y artefactos que entregar	4
II. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO	4
3. Recursos Humanos y profesionales	4
4. Roles y responsabilidades.....	4
III. GESTIÓN DEL PROYECTO	5
5. Estimación Del Proyecto.....	5
6. Plan Del Proyecto	5
7. Diagrama De Gantt	5

I. GENERALIDADES DEL PROYECTO

En el presente documento se describe el propósito, alcance y objetivos del proyecto a alto nivel. Asimismo, se presenta el plan de trabajo del proyecto especificado por cada fase de desarrollo.

1.Descripción Del Proyecto

A continuación, se especifica el propósito, alcance y los objetivos del presente proyecto.

1.1. Propósito

El propósito de este proyecto es crear una aplicación web que permita a los emprendedores del distrito de Chosica poder ingresar y registrar su negocio. Además, la aplicación deberá permitir solicitar una licencia de funcionamiento a través de la plataforma asimismo se estará incluyendo las funcionalidades de acuerdo al levantamiento de los requerimientos.

Con el desarrollo de este proyecto, se busca impulsar que los emprendedores puedan trabajar manera legal e impulsar facilitando los trámites para generar la recuperación económica de dicho distrito.

1.2. Alcance

Desarrollo e implementación de una aplicación web para el registro de emprendedores, licencias de funcionamiento, etc..

1.3. Objetivos

- ✓ Desarrollo e implementación de la aplicación al 100%
- ✓ El 90% de las solicitudes de licencias de funcionamiento deben ser realizadas desde la plataforma web.
- ✓ El 90% de los emprendedores del distrito de Chosica deben de estar registrados en la plataforma web.

2. Artículos y artefactos que entregar

Ítem	Detalle
Plan de trabajo	Documento con la especificación del proyecto (alcance, propósito, objetivos, diagrama de Gantt.)
Manual de usuario	Documento explicado del funcionamiento de la aplicación web.
Propuesta de diseño	Documento con la propuesta de diseño de la aplicación.
Listado de requerimientos funcionales	Documento con el listado de requerimientos funcionales del sistema.
Listado de requerimientos no funcionales	Documento con el listado de requerimientos no funcionales del sistema.

Tabla 1.- Artículos y artefactos a entregar

Fuente. - Elaboración propia

II. ORGANIZACIÓN

En los siguientes ítems se especifica la organización del proyecto como son los roles y responsabilidades de cada recurso.

3. Recursos Humanos y profesionales

Nombres	Información Contacto
Roger Rojas	Teléfono: 927-753-563 Correo: rogerrojashilario@hotmail.com
Marjorie Huarcaya	Teléfono: 987-367-234 Correo: peruviangroup_services_hv@outlook.com

Tabla 2.- Recursos humanos y responsabilidades

Fuente. - Elaboración propia

4. Roles y responsabilidades

Rol	Descripción	Responsable
Líder del Proyecto	Encargado del levantamiento de los requerimientos del sistema. En constatación de comunicación con el usuario.	Roger Rojas
Analista Programador	Encargado del análisis de los requerimientos y desarrollo de la aplicación web.	Marjorie Huarcaya

Tabla 3.- Roles y responsabilidades

Fuente. - Elaboración propia

III. GESTIÓN DEL PROYECTO

5.Estimación Del Proyecto

El siguiente proyecto tiene una estimación de **63** días laborables para su desarrollo e implementación.

6.Plan Del Proyecto

Fases y línea base

Ítem	Descripción	Número de Iteraciones
Inicio	En esta fase se tiene las primeras reuniones para dar a conocer el proyecto y que es lo que se quiere solucionar de manera general	[1, 1.1]
Análisis	En esta fase se levanta los requerimientos funcionales y no funcionales para identificar los principales flujos del proceso de negocio.	[2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3]
Diseño	En base al levantamiento de información se realiza una propuesta de diseño para su aprobación posteriormente.	[3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2]
Desarrollo	Inicia con la construcción del software. En esta fase se tiene presentaciones preliminares del proyecto.	[4, 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2]
Pruebas	Se tiene las pruebas con el usuario del sistema.	[5, 5.1, 5.2]
Implementación	Se despliega el proyecto	[6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5]
Cierre	Se cierra el proyecto.	[7, 7.1]

Tabla 4.- Fase de línea base

Fuente. - Elaboración propia

7.Diagrama De Gantt

Diagrama Gantt

En este diagrama de Gantt se muestra de manera resumida el ciclo de vida del proyecto desde la fase de inicio hasta el cierre del proyecto. También se puede observar la duración total de cada fase.

Núme...	Nombre	Asignado a	Inicio	Finalización	Duración	% completado	Depende de
1	Inicio		6/3/2023	16/3/2023	9 días	75%	
1.1	Planeamiento del plan de trabajo	RR MC	6/3/2023	16/3/2023	9 días	75%	
2	Análisis		17/3/2023	4/4/2023	13 días	0%	
2.1	Análisis de requerimientos funcionales		17/3/2023	28/3/2023	8 días	0%	
2.1.1	Levantamiento de los requerimientos funcionales	RR MC	17/3/2023	24/3/2023	6 días	0%	
2.1.2	Elaborar de documento de requerimientos funcionales	SH silvia huarcaya	27/3/2023	27/3/2023	1 día	0%	5FC
2.1.3	Aceptación de los requerimientos funcionales	MC municipalidad cho	28/3/2023	28/3/2023	1 día	0%	6FC
2.2	Análisis de requerimientos no funcionales		29/3/2023	4/4/2023	5 días	0%	
2.2.1	Levantamiento de los requerimientos no funcionales	RR MC	29/3/2023	31/3/2023	3 días	0%	
2.2.2	Elaboración de documento de requerimientos no funcion...	SH silvia huarcaya	3/4/2023	3/4/2023	1 día	0%	9FC
2.2.3	Aprobación de los requerimientos no funcionales	MC municipalidad cho	4/4/2023	4/4/2023	1 día	0%	10FC
3	Diseño		5/4/2023	10/4/2023	4 días	0%	3FC 7FC
3.1	Diseño de aplicación		5/4/2023	10/4/2023	4 días	0%	
3.1.1	Propuesta del diseño de la aplicación web (mockup)	SH silvia huarcaya	5/4/2023	7/4/2023	3 días	0%	
3.1.2	Aprobación de la propuesta de diseño	MC municipalidad cho	10/4/2023	10/4/2023	1 día	0%	

Ilustración 1.- Diagrama de Gantt parte I

Fuente. - Elaboración propia

4	▼ Desarrollo			11/4/2023	19/5/2023	29 días		0%	12FC
4.1	▼ FrontEnd			11/4/2023	13/4/2023	3 días		0%	
4.1.1	Maquetado de la aplicación web	SH	silvia huarcaya	11/4/2023	13/4/2023	3 días		0%	
4.2	▼ BackEnd			14/4/2023	19/5/2023	26 días		0%	
4.2.1	Diseño y modelado de las base de datos de emprendedo...	SH	silvia huarcaya	14/4/2023	14/4/2023	1 día		0%	
4.2.2	Desarrollo de los requerimientos funcionales	SH	silvia huarcaya	17/4/2023	19/5/2023	25 días		0%	
5	▼ Pruebas			22/5/2023	23/5/2023	2 días		0%	16FC
5.1	Pruebas Unitarias - Desarrollo	SH	RR	22/5/2023	23/5/2023	2 días		0%	
5.2	Pruebas con el cliente - QA	MC	RR	22/5/2023	23/5/2023	2 días		0%	
6	▼ Implementación			24/5/2023	30/5/2023	5 días		0%	
6.1	Configuración del servidor	SH	silvia huarcaya	24/5/2023	24/5/2023	1 día		0%	
6.2	Despliegue de BD	SH	silvia huarcaya	24/5/2023	24/5/2023	1 día		0%	
6.3	Despliegue de aplicaciones Webs	SH	silvia huarcaya	24/5/2023	24/5/2023	1 día		0%	
6.4	Capacitación a los usuarios del sistema (Interno)	RR	SH	25/5/2023	29/5/2023	3 días		0%	
6.5	Manual de Usuario	SH	silvia huarcaya	30/5/2023	30/5/2023	1 día		0%	
7	▼ Cierre			31/5/2023	31/5/2023	1 día		0%	
7.1	Acta de Cierre del proyecto	RR	MC	31/5/2023	31/5/2023	1 día		0%	


Ilustración 2.- Diagrama de Gantt parte II

Fuente. - Elaboración propia



Diagrama Gantt Detallado

En este diagrama de Gantt se muestra el desglose de cada una de las fases del proyecto para una revisión más profunda. Asimismo, se observa la persona encargada de ejecutar cada una de las actividades el proyecto.

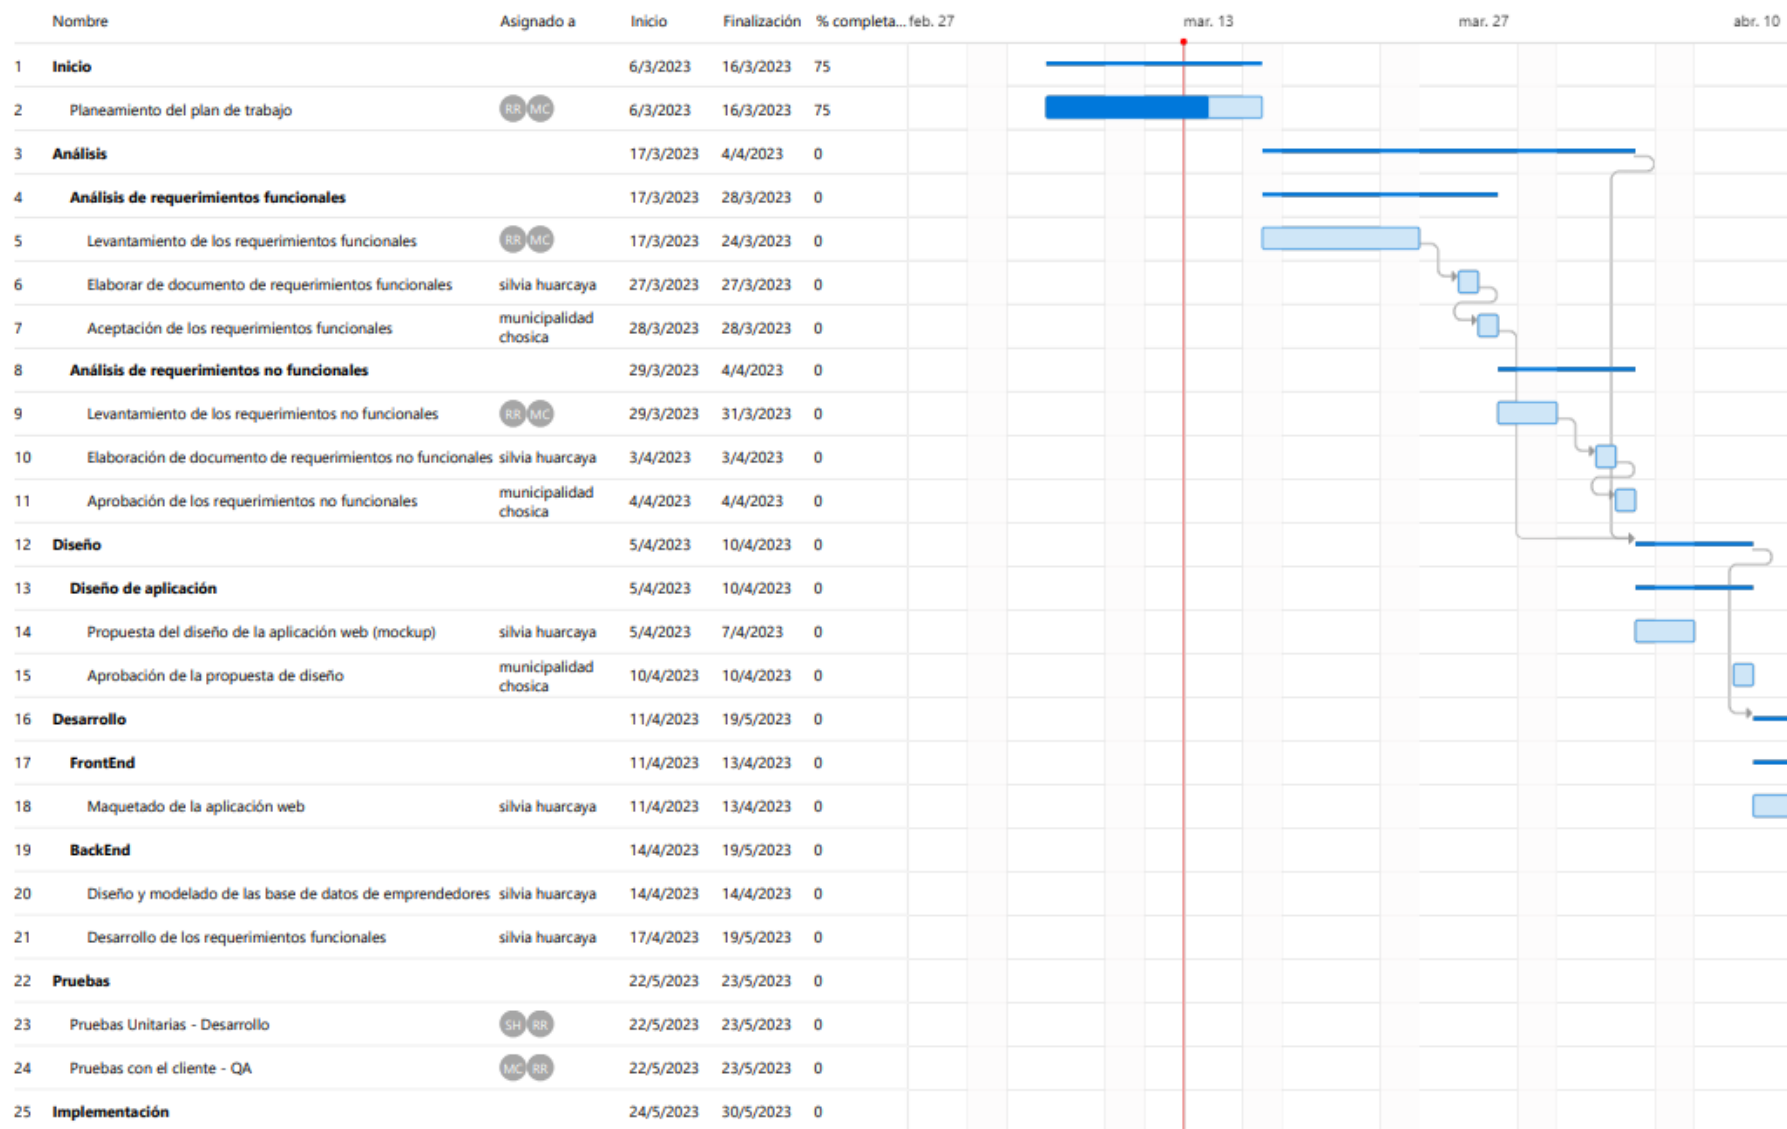

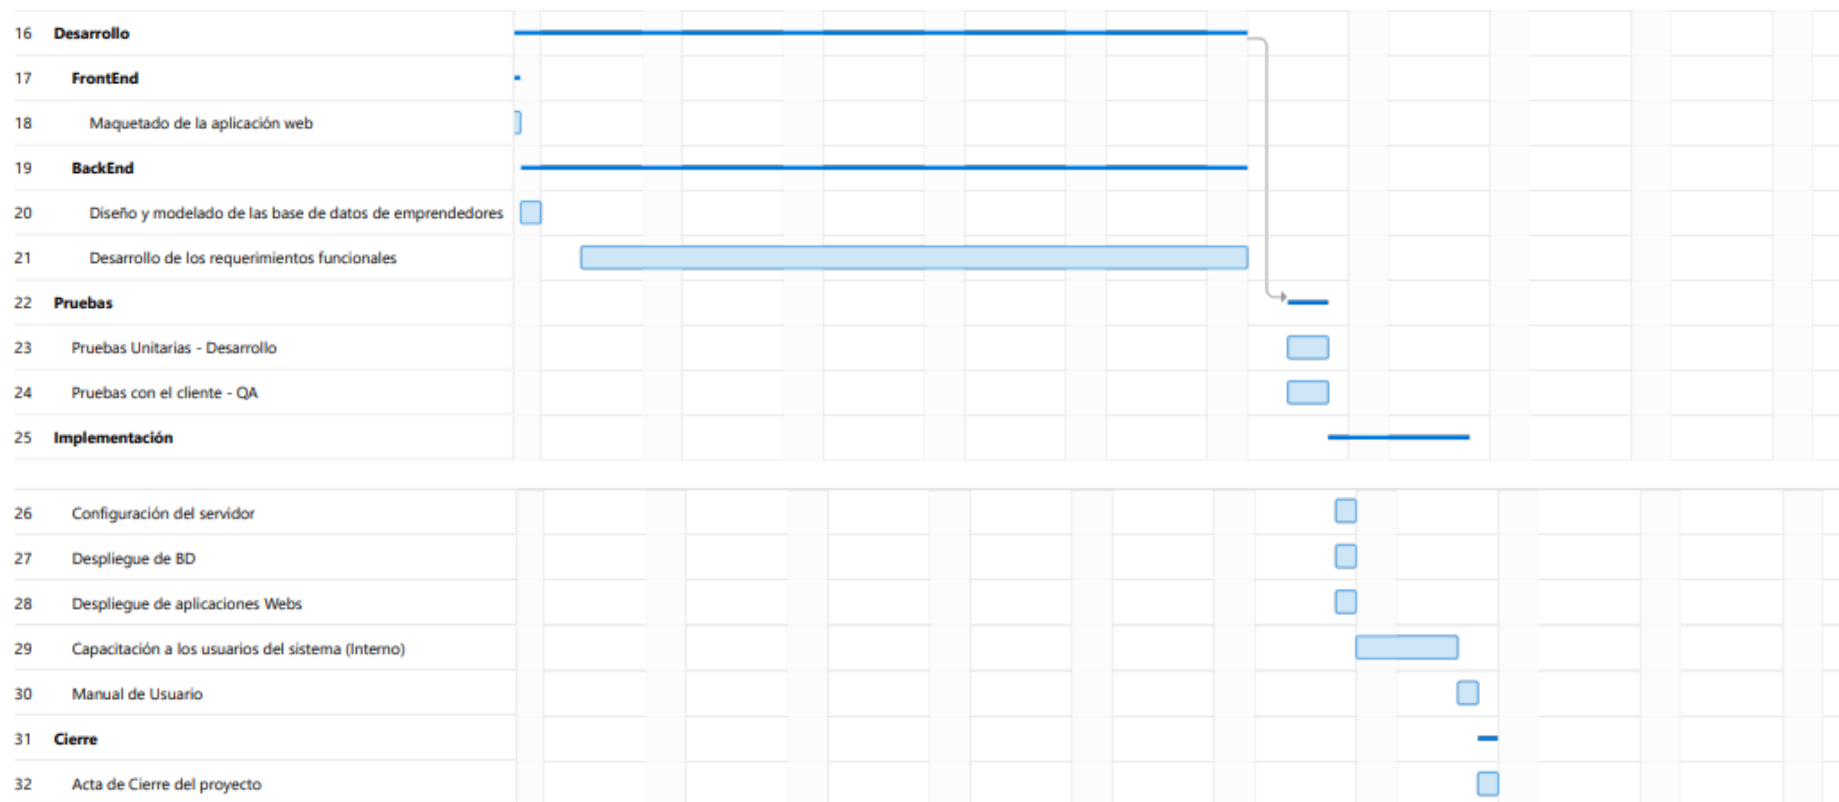


Ilustración 3.- Diagrama de Gantt Detallado

Fuente. - Elaboración propia



Historial del Documento:

Viernes 17 de marzo del 2023 - segunda versión - v2.0.0

✓ versión Inicial
